

Sörgårdens FS, veckorapport V 16/17, 2016

Pågående aktiviteter:

Mark:

- Yttre markarbeten

Bygg:

- Sista bottenplatta hus B gjuten 18/4
- Utfackningsväggar hus A och D
- Yttertak hus A och D
- Fabricering utfackningsväggar i fältstation till Hus C
- Smidesarbeten i Hus B och C
-

Rör:

- Yttre VA
-

Vent:

-

El:

-
-

Tidsplan:

- Uppdaterad tidplan dat. 2016-02-02 finns inlagd på Pärmen.
- Projektet ligger i fas med tidplanen med slutbesiktning 2017-06-19
-

Kvalitet/miljö:

- Kontroll pågår fortlöpande. Inga anmärkningar noterade


Övrigt:

Vad händer vecka 18/19 ?

- Fabricering utfackningsväggar
- Kompletteringsarbeten på resta byggnader
- Montage yttreväggar och tak Hus C
- Yttre markarbeten



Stomme Hus A

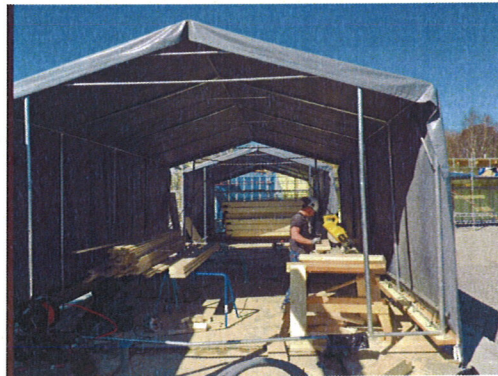

Fältstation för väggelement under tält



Vy mot Hus A och D

Tumba 2016-05-02

J-C/Tobias
